Suomen Voima Oy / Rokamo-Nälkämän tuulivoimahanke

Viite: Kemijärven Kaupunki / Pyyntö Rokamo-Nälkämän tuulivoimahankkeen kaavoitussopimuksen jatkamisesta

Suomen Voima Oy pyytää kunnioittavasti Kemijärven kaupunkia jatkamaan Rokamo-Nälkämän tuulivoimahankkeen (”Hanke”) kaavoitusta koskevan sopimuksen voimassaoloa vuoden 2029 loppuun saakka. Tällä hetkellä voimassa oleva 26.6.2023 allekirjoitettu kaavoitussopimus, jota Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 20.11.2025 jatkanut yhdellä vuodella, raukeaa vuoden 2026 loppuun mennessä mikäli osayleiskaavaa ei ole käsitelty valtuustossa.

Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan Kemijärven yhteismetsän alueella (320-874-1-0).

Hankkeen YVA-menettelyssä esiin nousseiden vaikutusten huomioon ottamiseksi hankealuetta ja voimalapaikkojen layout-suunnitelmaa on muutettu vuoden 2025 tilanteesta. Muutoksilla pyritään erityisesti vähentämään ja hallitsemaan hankkeen yhteisvaikutuksia alueella sijaitsevan Nuolivaaran tuulivoimapuiston kanssa. Päivitetty suunnitelma edellyttää ennen kaavaehdotuksen viimeistelyä uusia täydentäviä ympäristöselvityksiä ja viranomaisarviointeja ja. Lisäksi uusille voimalapaikoille tulee hakea Puolustusvoimien lausunnot. Näistä syistä hankkeen kaavoitusta ei ole mahdollista saattaa valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä vaan vaatii arviomme mukaan useamman vuoden.

Hankkeen ajankohtainen tilanne, päivitetty hankealue, layout-suunnitelman pääperiaatteet sekä jatkosuunnittelun keskeiset työvaiheet esitetään tarkemmin tämän pyynnön liitteessä 1.

Edellä esitetyillä perusteilla pyydämme Kemijärven kaupunkia jatkamaan kaavoitussopimuksen voimassaoloa kolmella vuodella eli vuoden 2029 loppuun saakka. Riittävä jatkoaika mahdollistaa muuttuneen layout-suunnitelman edellyttämien lausuntojen ja selvitysten asianmukaisen toteuttamisen sekä niiden tulosten huomioon ottamisen kaavoituksessa. Pyydämme Kemijärven kaupunkia käsittelemään asian ja tekemään myönteisen päätöksen sopimuskauden jatkamisesta, jotta hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa hallitusti ja kaavoitus viedä asianmukaisesti päätökseen.

Kunnioittavasti,

Suomen Voima Oy



suomenvoima

Liite 1 - Rokamo-Nälkämä –hankkeen esittely ja tilannekatsaus

14.10.2026

Suomen Voima lyhyesti




Omistajina 18 kunnallis- ja yksityisomisteista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä

suomenvoima

Avaintiedot 2025

Henkilöstö	8+1
Tase	300 MEUR
Omavaraisuus	35 %
Liikevaihto	80 MEUR
Sähkön tuotanto	1,4 TWh
Spot-nettohankinta	1,1 TWh

Suomen Voima toimii sähkökaupan tasevastaavana

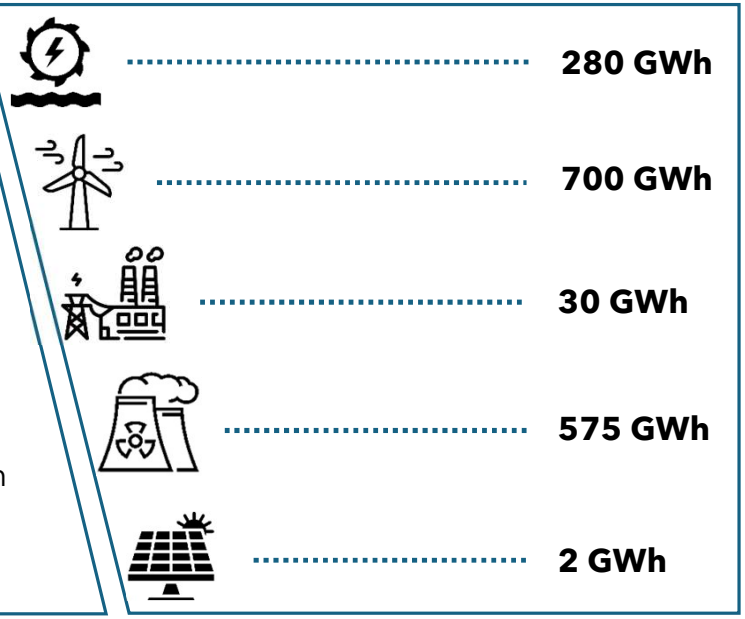

36 osakesarjaa

Luottamuksellinen / Confidential

Yleisesittely hankkeesta

- Suomen Voima on valmistellut Kemijärven Rokamo-Nälkämä-tuulivoimahanketta vuodesta 2023 alkaen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin enintään kahdeksan tuulivoimalan hanketta, jonka kokonaisteho on enintään 80 MW.


- Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ollut nähtävillä 10.4.-10.5.2024. OAS on saatavilla koko kaavaprosessin ajan ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä
- Hankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on ollut nähtävillä 29.10. – 28.11.2025 .

- Hankkeen YVA-arviointiohjelma on ollut nähtävillä 17.4.–16.5.2024 ja YVA-selostus 1.–31.10.2025.


- Hankkeelle on annettu perusteltu päätelmä 23.12.2025, jossa esiin nousivat erityisesti hankkeen linnustovaikutukset, sekä yhteisvaikutukset jo tuotannossa olevan Nuolivaaran tuulivoimapuiston kanssa.
  - Vastatakseen perustellussa päätelmässä ilmaantuneisiin ongelmiin, hankealuetta on siirretty päivitetyssä suunnitelmassa kokonaisuudessaan etelämmäs aiemmin esitetystä. Näin yhteisvaikutukset yhdessä Nuolivaaran tuulivoimapuiston kanssa saadaan hallittavalle tasolle.
  - Uusi hankealue koostuu edelleen yhteensä kahdeksasta voimalasta
  - Uusien voimalapaikkojen osalta arvioidaan täydentävien luonto- ja ympäristöselvitysten tarve. Päivitettäviä kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi kasvillisuus- ja linnustoselvitykset, melu- ja välkemallinnukset, näkemäalueanalyysi sekä havainnekuvat.
  - Vaikutusarvioinnit päivitetään uuden layoutin mukaisiksi kaavaehdotusta varten. Kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan, kun layout, viranomaiskannat ja tarvittavat lisäselvitykset ovat riittävällä tasolla.

- Vanha ja uusi hankealue sijaitsevat kokonaisuudessaan Kemijärven Yhteismetsän mailla.

- Nykyinen kaavoitussopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun. Hankkeelle haetaan kolmen vuoden jatkoaikaa vuoden 2029 loppuun saakka, jotta muuttuneen suunnitelman edellyttämät lausunnot, selvitykset ja vaikutusarvioinnit voidaan toteuttaa asianmukaisesti.

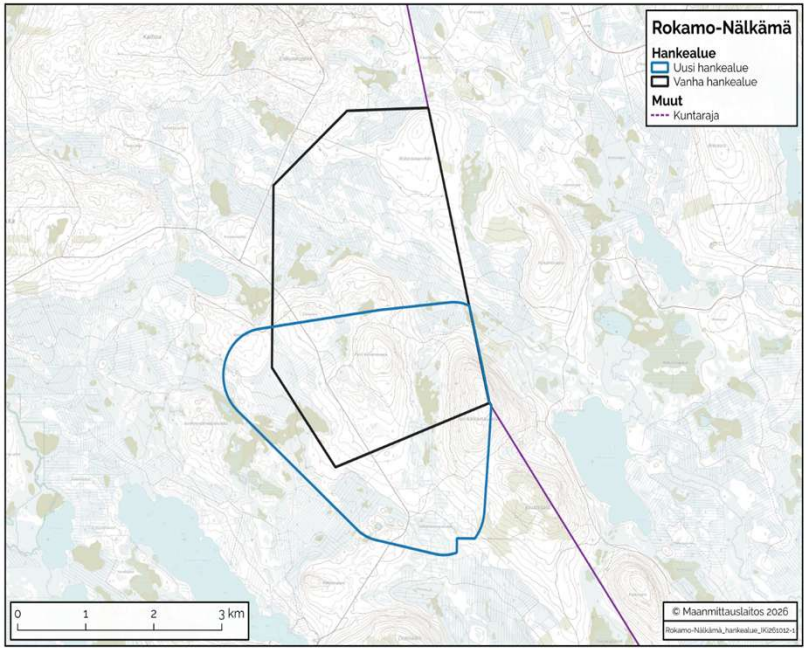

Tämä päivitetty hankealueen kartta suurempana seuraavalla sivulla

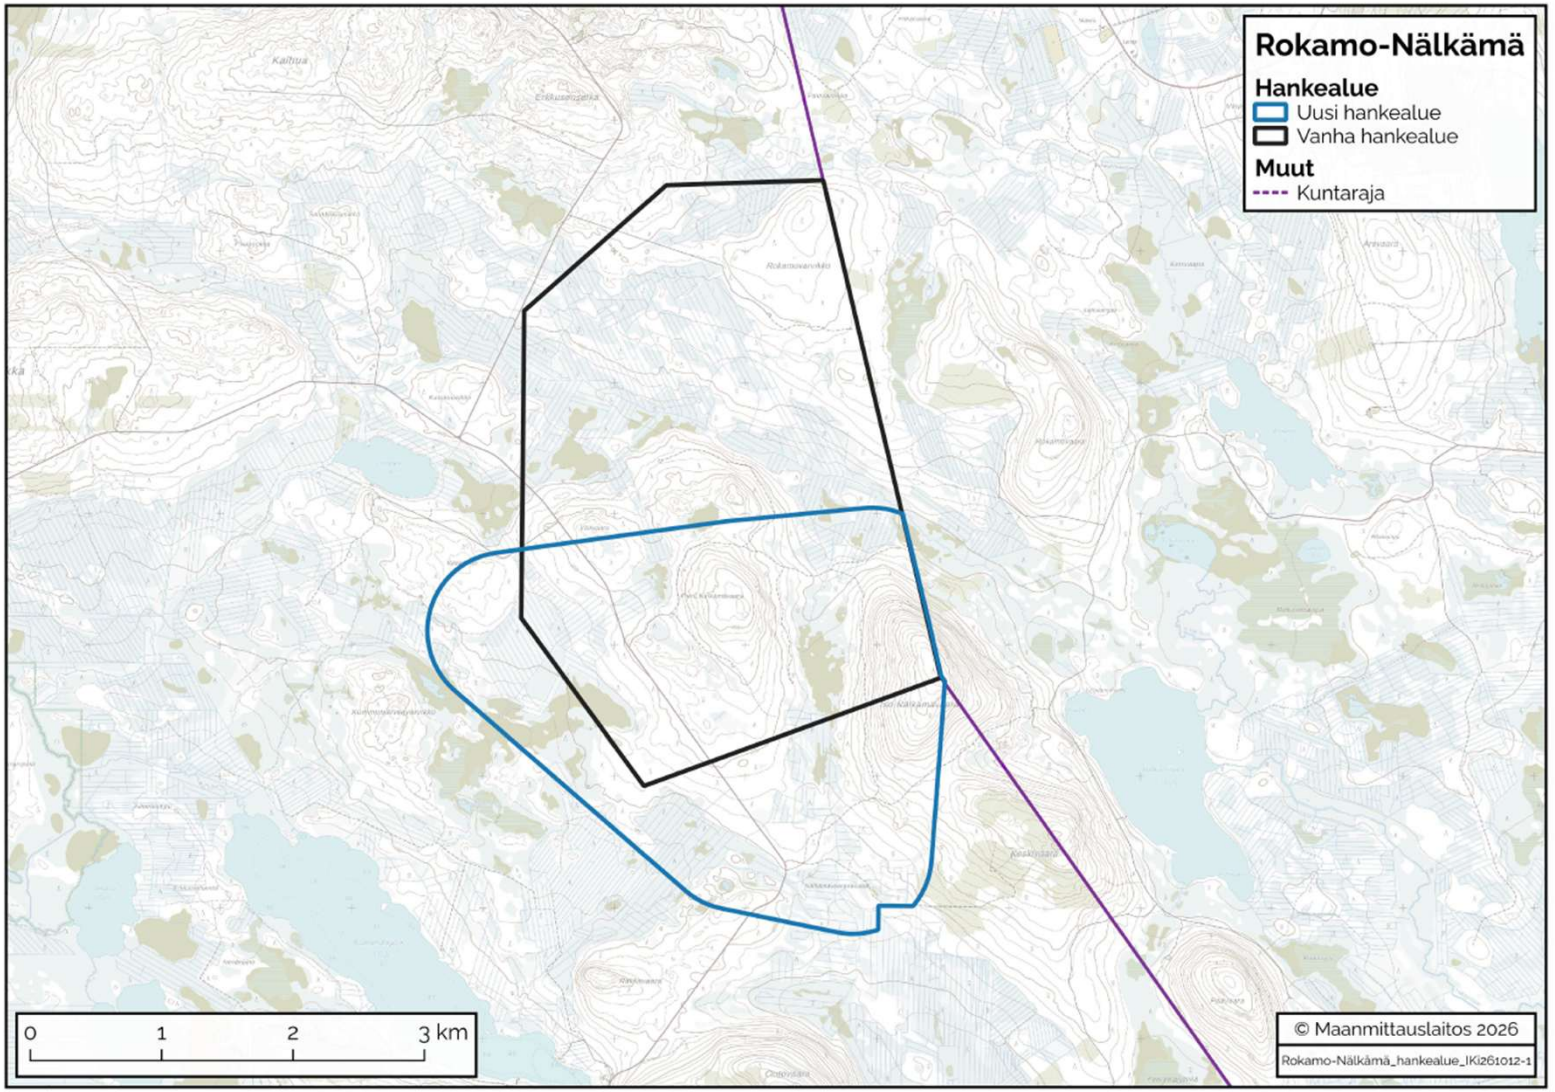

Luottamuksellinen / Confidential
